



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

DIAGNÓSTICO:
OBRAS PARALISADAS/INACABADAS em PE
2017/2018



FONTES DOS DADOS

- ✓ Dados fornecidos pelos jurisdicionados através dos Mapas de Obras da Prestação de Contas Anual 2017/2016;
- ✓ Dados fornecidos pelos jurisdicionados em resposta aos 283 ofícios de solicitação de informações complementares do Tribunal de Contas;
- ✓ Dados do “Tome Conta”;
- ✓ Dados dos trabalhos realizados pelo corpo técnico do TCE-PE, em 2017/2018.

ANÁLISE

Foram 1.942 contratos identificados inicialmente como obras paralisadas/inacabadas ou com fortes indícios.

Descrição	Valor Atual do Contrato (Contrato+Aditivos)	Número de Contratos
OBRAS DECLARADAMENTE PARALISADAS (A)	1.347.334.782,45	359
OBRAS COM INDÍCIOS DE PARALISADAS (B)	6.630.266.800,31	1.583
Total OBRAS PARALISADAS / INACABADAS (C) = (A + B)	7.977.601.582,76	1.942

ANÁLISE

Respostas aos Ofícios.

Descrição	Quantidade
Não apresentaram resposta	88
Apresentaram apenas solicitação de prorrogação de prazo	10
Apresentaram resposta	185
Total	283

34,6% não apresentaram resposta até 31/12/2018.

ANÁLISE

Respostas aos Ofícios.

Justificativa Recebida	Contrato reiniciado	Obra em execução	Obra concluída	Novo processo licitatório / Outra forma de execução	Obras já realizadas suficientes para prescindir novo contrato.	Houve equívoco na informação Anterior	Paralisada/ Inacabada	Não Houve Resposta
Total Contrato+Aditivos	19.403.199,96	195.342.758,57	89.163.426,98	442.374.437,22	13.348.808,83	10.078.302,00	4.469.918.259,39	2.777.507.876,11
Total Pago até dez/2016	3.753.702,46	50.043.662,03	70.931.902,12	129.661.108,96	6.298.339,00	5.596.350,71	1.186.158.176,22	1.194.019.396,89
Quantidade de Contratos	6	86	97	86	13	157	876	672
1993 Contratos								

RESULTADOS ENCONTRADOS

Informações Fornecidas na Prestação de Contas 2017		
Descrição	Valor Atual do Contrato (Contrato+Aditivos)	Número de Contratos
OBRAS DECLARADAMENTE PARALISADAS (A)	1.364.635.411,94	360
OBRAS COM INDÍCIOS DE PARALISADAS (B)	6.630.266.800,31	1.583
Total OBRAS PARALISADAS / INACABADAS (C) = (A + B)	7.994.902.212,25	1.943
Consolidação Após Resposta ao Ofício do TCE-PE		
Descrição	Valor Final do Contrato	Número de Contratos
Total Analisado (D)	13.886.012.231,81	4.981
Total Obras em execução ou concluídas antes do ofício (E)	5.868.875.162,75	2.988
RESPOSTA: Contratos Reiniciados ou Concluídos (F)	108.566.626,94	103
RESPOSTA: Obra com Nova Licitação ou Outra Forma de Execução (G)	442.374.437,22	86
RESPOSTA: Obras Já Realizadas Suficientes Para Prescindir de Novo Contrato (H)	13.348.808,83	13
RESPOSTA: Obra em Execução (I)	195.342.758,57	86
RESPOSTA: Houve Equívoco na Informação Anterior do Gestor (J)	10.078.302,00	157
RESPOSTA: Não respondido até 31/12/2018 e com indícios de Paralisada/Inacabada. (K)	2.777.507.876,11	672
Total de Obras Paralisadas/Inacabadas com Respostas (L) = (D - E - F - G - H - I - J - K)	4.469.918.259,39	876
Após Esclarecimentos Prestados Pelos Gestores		
Descrição	Valor Final do Contrato	Número de Contratos
Obras que os Gestores não Apresentaram Resposta ao Ofício do TCE-PE (L)	2.777.507.876,11	672
Total que Pemaneceram como OBRAS PARALISADAS (M)	4.469.918.259,39	876
Total de Obras Paralisadas/Inacabadas (N) = (L + M)	7.247.426.135,50	1.548

RESULTADOS ENCONTRADOS

Classificação da Obra/Serviço de Engenharia	Total de Contratos	
	Valor em Contrato	Quantidade de Contratos
Recursos Hídricos - Barragens	322.630.888,51	21
Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	860.443.704,91	245
Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	575.502.245,52	564
Educação - Quadras em Unidades de Ensino	98.747.785,93	129
Energia - combustíveis e derivados	59.037.667,23	13
Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)	173.887,11	1
Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	379.400.676,86	541
Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	762.160.782,75	120
Saneamento	108.564.314,75	71
Macro drenagem - Canais e Rios	823.164.810,20	41
Rede de Drenagem de águas pluviais	263.828.584,33	63
Habitação	319.859.550,69	49
Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares	72.724.275,41	29
Mobilidade urbana - vias urbanas	1.586.797.656,45	773
Mobilidade urbana - VLT, BRT, Metrô e similares	481.895.625,65	21
Mobilidade urbana - Terminais	46.248.733,48	36
Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	545.274.718,82	456
Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	293.953.768,50	36
Transporte - Ferrovias	120.790.592,06	5
Transporte - Portos	427.405.023,08	27
Transporte - Rodovias	1.822.181.920,59	102
Transporte - Estações Rodoviárias	1.703.520,19	2
Edificações Administrativas Diversas	785.624.774,19	777
Infraestrutura Turística	169.645.976,78	262
Monumentos Históricos	4.027.095,90	5
Prevenção em Áreas de Risco	73.348.821,39	37
Infraestrutura Urbana - Urbanização	283.869.951,29	60
Estradas Vicinais	20.869.001,61	81
Iluminação Pública	79.808.444,17	82
Limpeza Urbana	2.453.209.437,85	135
Transporte Escolar	3.637.115,90	14
Não é obra nem serviço de engenharia	39.480.879,71	683
TOTAL	13.886.012.231,81	5481


RESULTADOS ENCONTRADOS

Classificação da Obra/Serviço de Engenharia	Obras Paralisadas/Inacabadas			
	Valor em Contrat	Quantidade de Contratos	% do Valor	% da Quantidade
Recursos Hídricos - Barragens	319.569.764,57	12	99,05%	57,14%
Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	497.340.832,06	83	57,80%	33,88%
Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	198.239.339,67	164	34,45%	29,08%
Educação - Quadras em Unidades de Ensino	34.414.877,72	62	34,85%	48,06%
Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	281.961.102,06	241	74,32%	44,55%
Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	606.069.165,42	47	79,52%	39,17%
Saneamento	13.489.569,31	26	12,43%	36,62%
Macro drenagem - Canais e Rios	769.403.794,17	28	93,47%	68,29%
Rede de Drenagem de águas pluviais	188.188.304,48	38	71,33%	60,32%
Habitação	313.739.862,49	35	98,09%	71,43%
Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares	59.951.017,02	8	82,44%	27,59%
Mobilidade urbana - vias urbanas	1.179.133.867,08	340	74,31%	43,98%
Mobilidade urbana - VLT, BRT, Metrô e similares	451.849.522,52	3	93,77%	14,29%
Mobilidade urbana - Terminais	35.461.364,33	9	76,68%	25,00%
Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	244.359.937,47	123	44,81%	26,97%
Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	165.587.657,86	15	56,33%	41,67%
Transporte - Ferrovias	3.501.084,24	1	2,90%	20,00%
Transporte - Portos	329.104.364,89	6	77,00%	22,22%
Transporte - Rodovias	970.627.955,85	37	53,27%	36,27%
Transporte - Estações Rodoviárias	55.209,17	1	3,24%	50,00%
Edificações Administrativas Diversas	268.250.264,58	169	34,14%	21,75%
Infraestrutura Turística	33.030.952,45	20	19,47%	7,63%
Monumentos Históricos	2.415.461,24	1	59,98%	20,00%
Prevenção em Áreas de Risco	59.131.412,61	25	80,62%	67,57%
Infraestrutura Urbana - Urbanização	170.017.276,73	27	59,89%	45,00%
Estradas Vicinais	878.635,30	6	4,21%	7,41%
Iluminação Pública	51.653.540,21	21	64,72%	25,61%
TOTAL	7.247.426.135,50	1548	63,63%	33,30%

RESULTADOS ENCONTRADOS

Obras Paralisadas = R\$ 7,25 bilhões


(% de Valores de Contrato por tipo de obra)

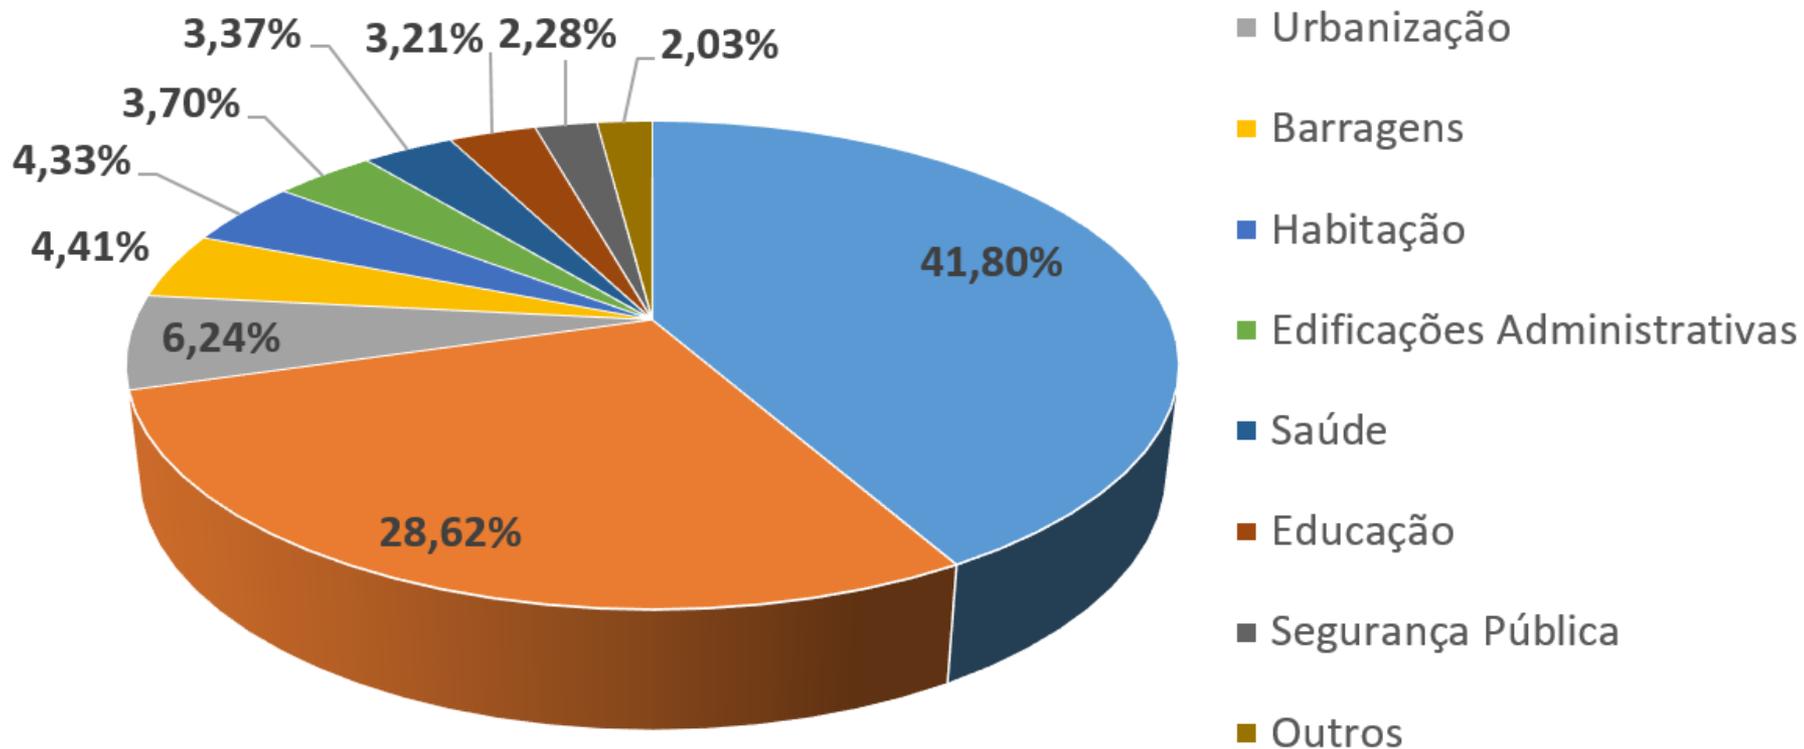

RESULTADOS ENCONTRADOS

Obras Paralisadas


(% do Valor de Obras Paralisadas por Tipo)

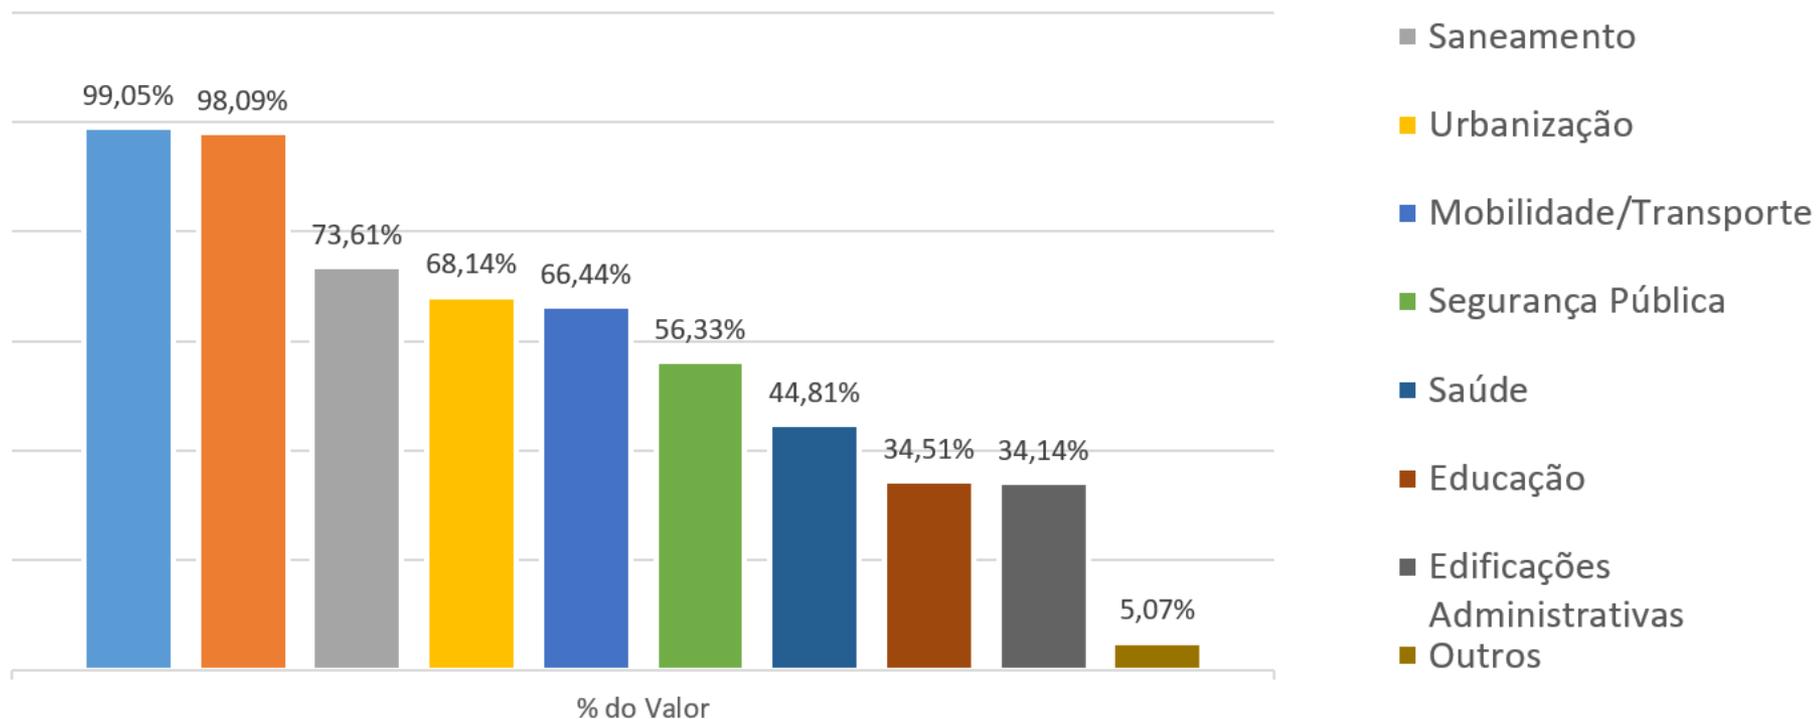

RESULTADOS ENCONTRADOS

COMPARATIVO 2013/2014/2015/2016/2017


Bilhões

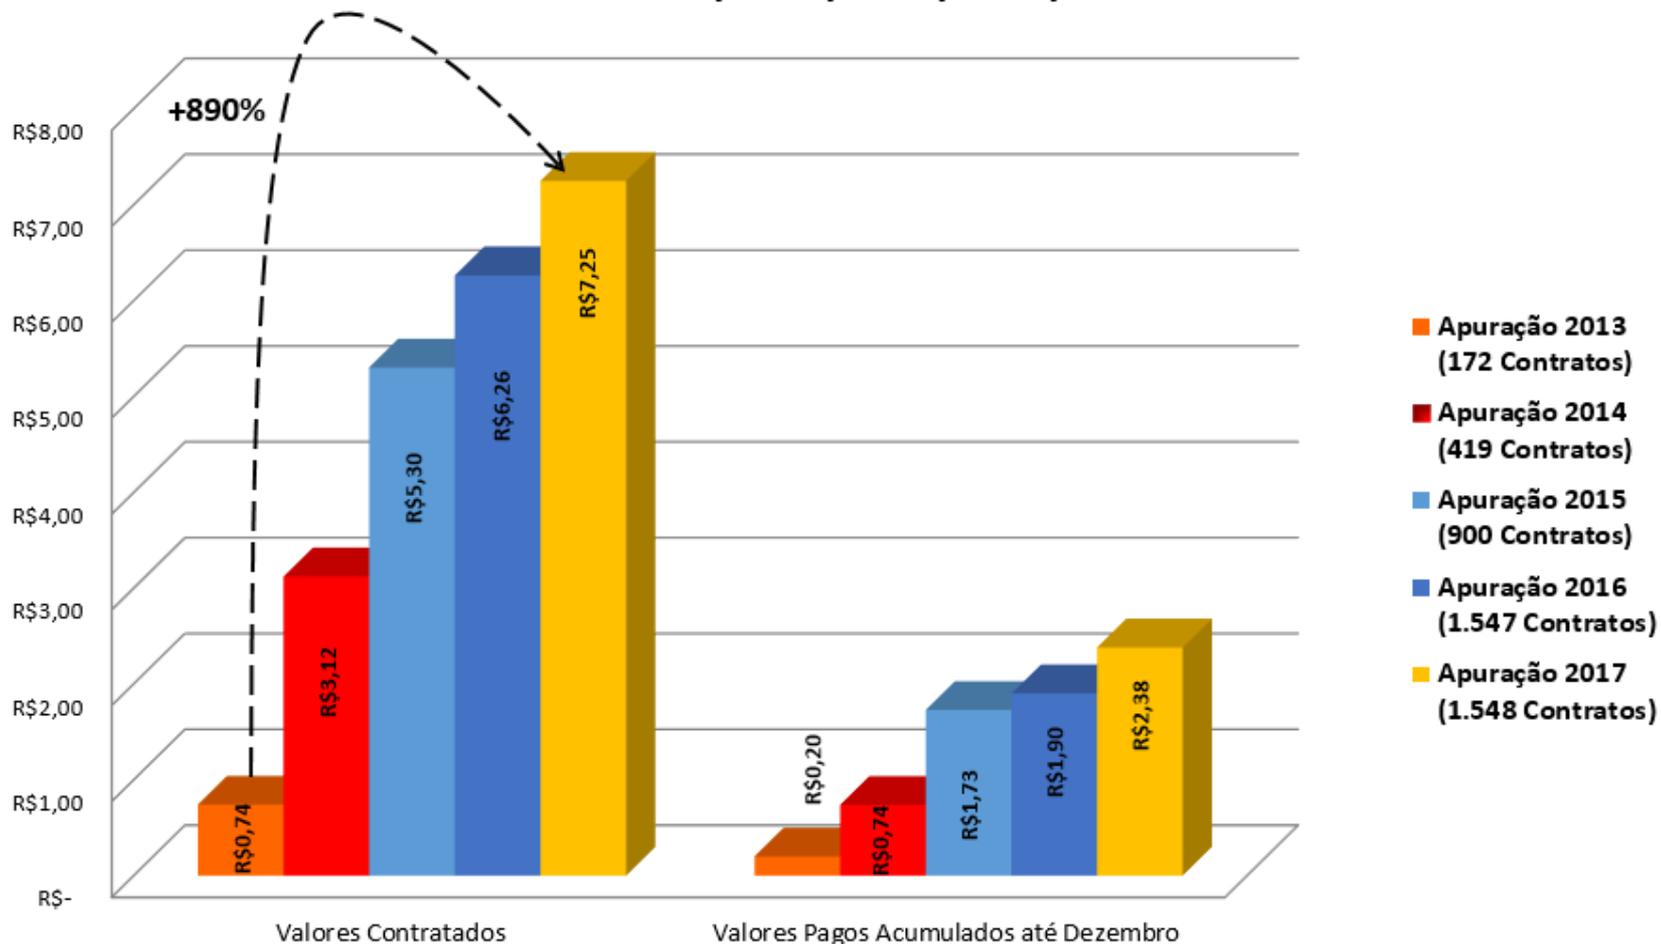

RESULTADOS ENCONTRADOS

COMPARATIVO 2013/2014/2015/2016/2017

Bilhões

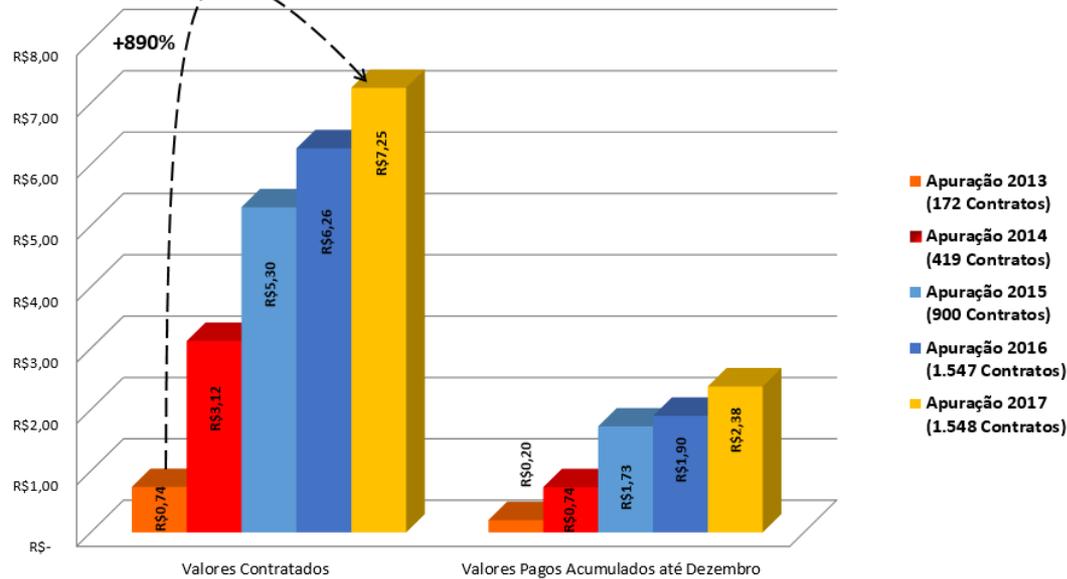

Ocorrência	Quantidade	Valor Contrato
Obras Paralisadas em 2017 reiniciadas em 2018	80	458.714.917,19
Obras Paralisadas em 2017 concluídas em 2018	57	70.557.682,24
Total	137	529.272.599,43

DIAGNÓSTICO NACIONAL



ATRICON

ASSOCIAÇÃO DOS
MÉMBROS DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS DO BRASIL

PORTARIA Nº 21/2018

Indica integrantes do Sistema Tribunais de Contas para compor o 'Comitê Interinstitucional de Diagnóstico de Grandes Obras Suspensas e Paralisadas'.

Ao manifestar que a persecução pelo aprimoramento é atividade inexaurível; é atitude coletiva; é fomento à gestão pública ética; é estímulo ao controle social;

Ao reconhecer que a efetivação das ações de fiscalização e controle é alcançada quando os interesses da cidadania são contemplados;

Ao considerar a relação, harmoniosa e respeitosa, entre as instituições e os Poderes Públicos, como fator condicionante à satisfação dos resultados da gestão pública;

Ao referendar o 'Diálogo Institucional', convocado pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, como iniciativa preponderante à retomada do desenvolvimento do Brasil e para o desentrelaçamento de serviços essenciais à população brasileira;

Ao confirmar que o Sistema Tribunais de Contas incorpora todo o interesse e dispõe do aparato necessário para contribuir com o procedimento de identificação das obras paralisadas no Brasil;

*Ao associar esse protagonismo ao **Tribunal de Contas da União**, com a sua indispensável capacidade de conduzir e coordenar auditorias;*

O Presidente da Atricon, usando das prerrogativas conferidas nos incisos II e X do art. 10 do Estatuto da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil,

RESOLVE:

Art. 1º. Indicar integrantes do Sistema Tribunais de Contas para a composição do 'Comitê Interinstitucional de Diagnóstico de Grandes Obras Suspensas e Paralisadas'.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília-DF, 7 de dezembro de 2018.

Fábio Túlio Filgueiras Nogueira
Presidente

DIAGNÓSTICO NACIONAL

Extratificação por Valor de Contrato	Paralisada/ Inacabada	Não Houve Resposta
Número de Contratos maiores que R\$1,5 milhão	247	188
Valor dos Contratos maiores que R\$1,5 milhão	4.196.224.464,52	2.614.722.703,87
Número de Contratos menores que R\$1,5 milhão	613	426
Valor dos Contratos menores que R\$1,5 milhão	273.693.794,87	162.785.172,24

DIAGNÓSTICO NACIONAL

Classificação da Obra/Serviço de Engenharia	Obras Paralisadas/Inacabadas Acima de R\$1,5mi	
	Valor em Contratos	Quantidade de Contratos
Recursos Hídricos - Barragens	317.311.244,01	8
Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	477.480.448,19	32
Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	122.540.620,51	39
Educação - Quadras em Unidades de Ensino	7.352.743,23	4
Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	211.684.820,68	33
Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	601.705.196,19	32
Saneamento	4.377.520,61	1
Macro drenagem - Canais e Rios	766.941.126,40	17
Rede de Drenagem de águas pluviais	180.318.653,88	13
Habitação	306.052.195,25	23
Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares	59.516.474,79	3
Mobilidade urbana - vias urbanas	1.074.532.012,68	75
Mobilidade urbana - VLT, BRT, Metrô e similares	451.849.522,52	3
Mobilidade urbana - Terminais	33.990.114,05	5
Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	211.471.257,44	34
Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	164.305.814,58	12
Transporte - Ferrovias	3.501.084,24	1
Transporte - Portos	328.801.822,19	5
Transporte - Rodovias	969.892.279,87	35
Edificações Administrativas Diversas	228.205.808,93	24
Infraestrutura Turística	26.335.039,42	4
Monumentos Históricos	2.415.461,24	1
Prevenção em Áreas de Risco	50.224.760,75	8
Infraestrutura Urbana - Urbanização	164.354.687,11	13
Iluminação Pública	45.786.459,63	10
TOTAL	6.810.947.168,39	435

AÇÕES DO TCE-PE

1. Ações Corretivas = Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia

- ✓ 377 contratos auditados (R\$ 21,6 bilhões), sendo 330 obras (R\$ 4,6 bilhões em contratos)
- ✓ 18 Processos Instaurados, sendo 14 de obras
- ✓ Benefícios de R\$ 5 milhões, em 43 obras (glosa, redução valor ou restituição)
- ✓ 137 obras reiniciadas = R\$ 529 milhões em contratos

AÇÕES DO TCE-PE

2. Ações Preventivas = Auditoria de Licitações

- ✓ 92 análises de licitações (R\$ 1 Bilhão), 50 licitações de obras (R\$ 523 milhões)
- ✓ 05 Processos Instaurados
- ✓ Benefícios de R\$ 18,4 milhões (Redução preço da Licitação ou do contrato), onde 2,7 milhões em Obras

NOVAS AÇÕES PREVISTAS PARA 2019

Auditoria em Obras Paralisadas

- ✓ Criação de Equipe Específica
- ✓ Inclusão no Escopo das Equipes existentes
- ✓ Reiteração dos ofícios e aplicação de auto de infração para aqueles que não responderam
- ✓ Alimentação de formulário de informações complementares para Diagnóstico Nacional (Grandes Obras Paralisadas – ATRICON)
